

KIM



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

105/18-52/2014/1024

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA BKF/K-46/2014


BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

KÖZLEKEDÉS FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015. SZEPTEMBER 17.
2015. „.....” „.....”.

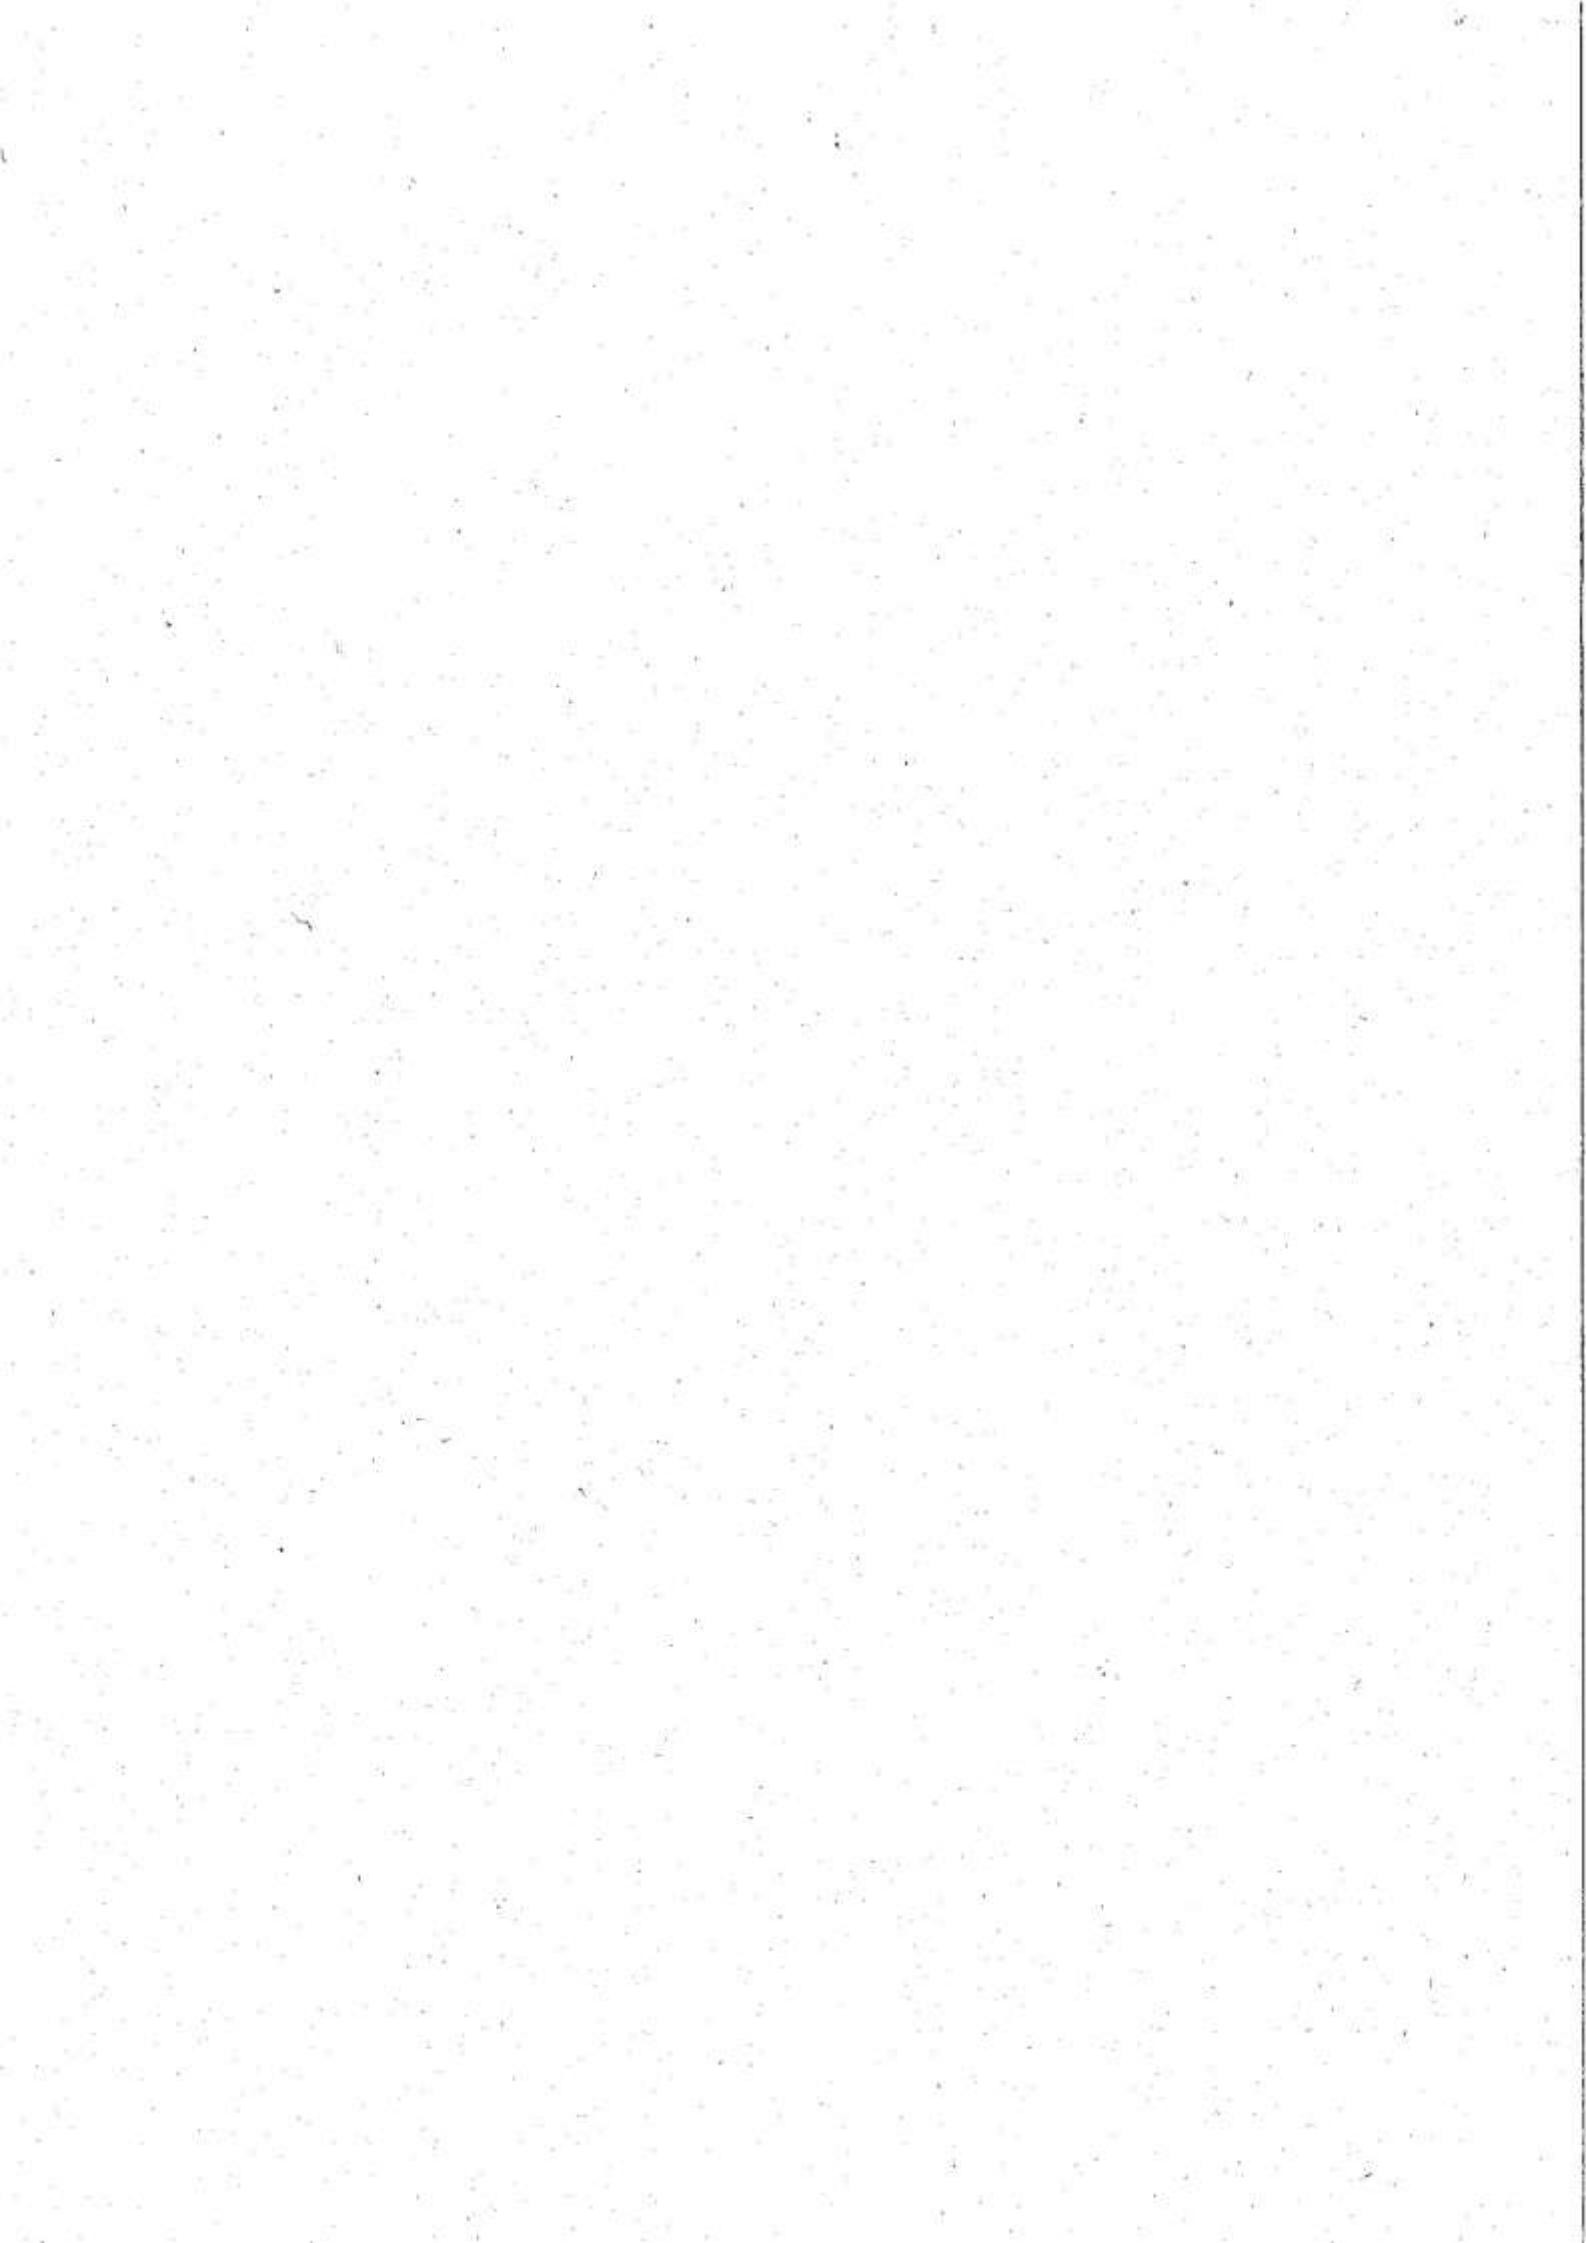



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. 4-5.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-065890
adószáma: 10336706-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik része, 122/A. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Bartók Béla út keresztmetszeti újrafelosztásának tervezése**” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy 2015. január 9. napján, 1054/18-19/2014/1024. iktatószám alatt, „**Bartók Béla út keresztmetszeti újrafelosztásának tervezése**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratúval a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:
- 2.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján készült bírálati terveket a Vállalkozó a Műszaki diszpozíciónak megfelelően 2015. április 9. napján leszállította, és megküldte egyidejűleg véleményezésre a XI. Kerület, Újbuda Önkormányzat részére.

- 2.3. A 2015. május 12. napján tartott egyeztetésen a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat”) képviselői arról tájékoztatták a Vállalkozót, hogy a benyújtott tervek felülvizsgálata szükséges, amely felülvizsgálattal Vállalkozó 2015. május 18. napján készült el. A Vállalkozó által felülvizsgált tervek az Önkormányzat által jóváhagyásra kerültek, azonban az eredeti elképzeléshez képest az így elfogadott megoldás szerint az érintett szakaszokon további engedélyköteles tevékenységek (útépítési tervek, forgalomtechnikai és szabályozástechnikai tervek, közműtervek) elvégzése vált szükségessé. Vállalkozó az eredeti szerződéses feltételeknek megfelelően leszállította a terveket 2015. május 26. napjára, azonban a jelen pontban foglaltak szerint szükségessé vált engedélyeket beszerezni nem tudta, amelyek pótlására Megrendelő póthatáridő kiszabásával lehetőséget adott. Tekintettel arra, hogy a Szerződésben foglalt többi részfeladat (2., 3., 4.) is az 1. részfeladatra épül, így a módosított tervek elkészültéig, és az engedélyköteles tevékenységek elvégzéséig a további részfeladatok teljesítése nem lehetséges. A tervek módosításának szükségessége, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyköteles tevékenységek elvégzése, előre nem volt látható Vállalkozó részéről, azonban emiatt nem tartható a Szerződés részfeladatainak határideje. Vállalkozó módosította az érintett terveket, amelyeket Megrendelő 2015. augusztus 7. napján jóváhagyott, azonban emiatt szükségessé vált a 2., 3., 4. részfeladatok tekintetében a határidők időarányos meghosszabbítása.
- 2.4. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ban foglalt, a Szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

A jelen 1. sz. Módosítás II. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:


„3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó köteles a Szerződést a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb **318. napig** teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:

	Részfeladat leírása	Teljesítési határidő (szerződéskötéstől számítva)	Kifizetés (%)
1. részfeladat	bírálati terv kidolgozása és leszállítása	90 nap kötbérterhes határidő	Első számla: az 1.1. - 1.2. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 40%
2. részfeladat	egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása és leszállítása	231 nap kötbérterhes határidő	
3. részfeladat.	kiviteli terv kidolgozása, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása	303 nap kötbérterhes határidő	Második számla: az 1.3. - 1.4. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 60%
4. részfeladat	végleszállítás	318 nap kötbérterhes határidő	

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.
- 4.3. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás öt (5) db – három (3) számozott oldalból álló – magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2015. 09. 17.



Nyul Zoltán
igazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Megrendelő

Budapest, 2015. 09. 17.



Kerényi László Sándor
stratégia vezető



Várady Tamás
ügyvezető

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103.
